


工事の進捗状況と今後の予定のお知らせ

【2020年8月時点】

古閑集落では、東方・西方の2工区に分けて工事を進めております。
 西方については概ね擁壁が完了し、9月より舗装工事を予定しております。
 東方についても引き続き、地盤改良・擁壁工事に行っております。
 ご迷惑をおかけしますがご協力のほどよろしくお願いいたします。

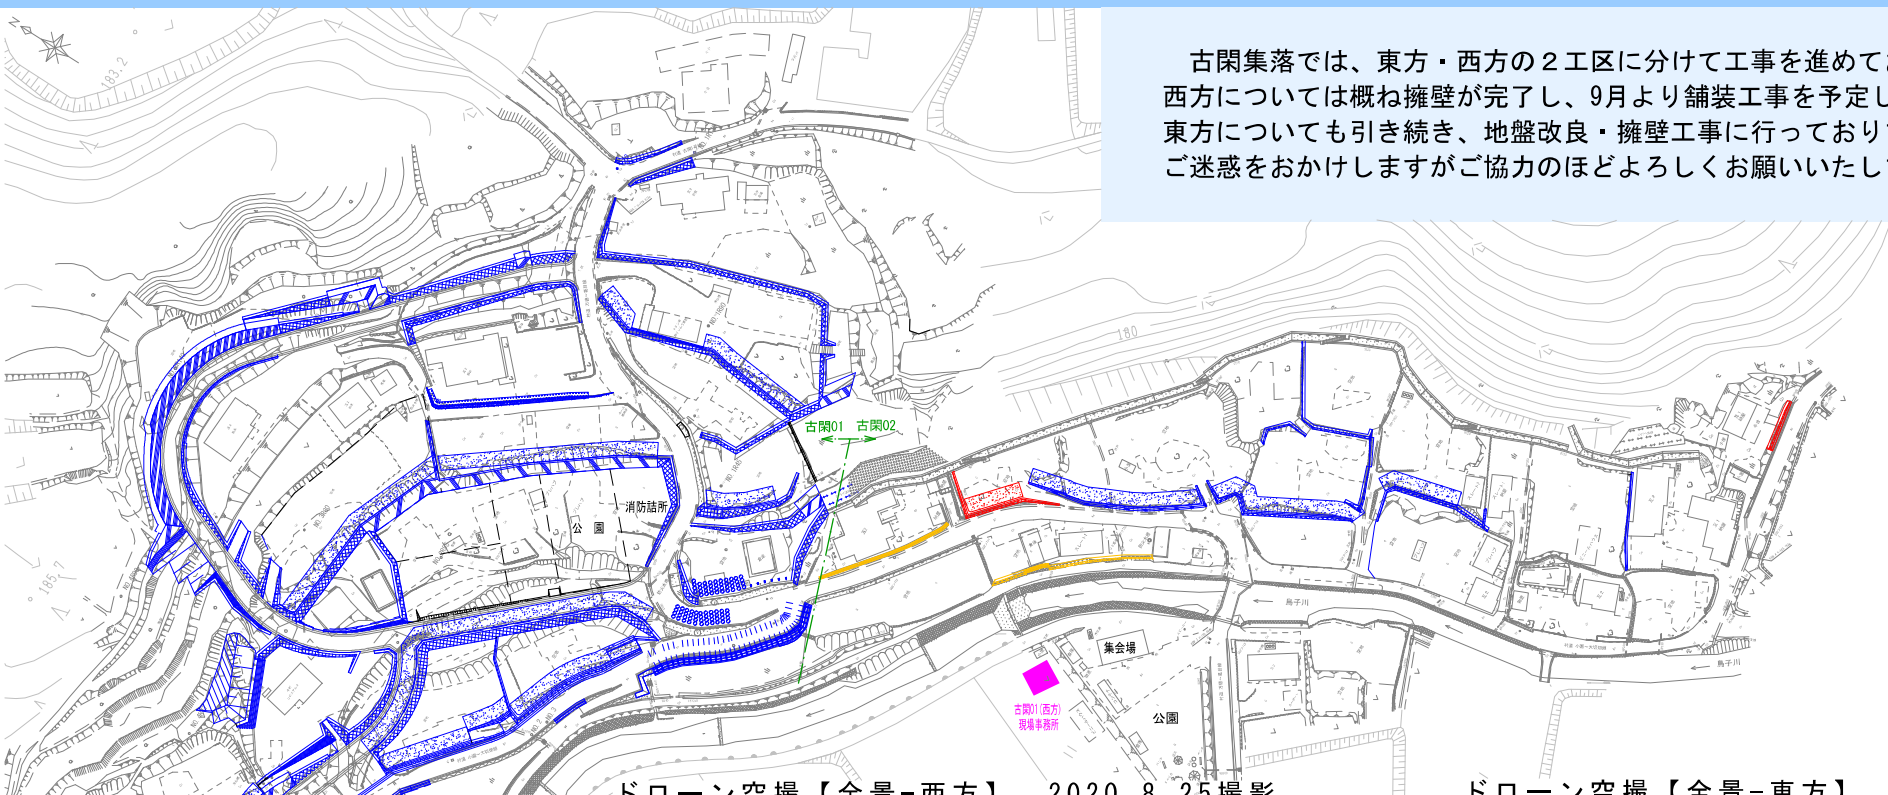

ドローン空撮【全景-西方】 2020.8.25撮影

ドローン空撮【全景-東方】 2020.8.25撮影



- ⊗ . . . 通行止め
- 計画箇所
- 次回予定箇所
- 施工箇所
- 完了箇所

※2020年8月末時点の施工予定のため進捗により箇所が異なる場合があります。

古閑01(西方)【工事業者】杉本・草村特定建設工事共同体
 古閑02(東方)【工事業者】日置工業株式会社
